Planning d' exécution des travaux d' aménagement d' un immeuble de bureaux à CLUNY

Tâches	Durée	Date Début	Date Fin
Préparation de chantier	25,00	30/05/2011	05/07/2011
01 GROS OEUVRE MACONNERIE	**136,00**	**9/06/2011**	**2/02/2012**
Mise en place installation de chantier	5,00	29/06/2011	05/07/2011
Replis installation de chantier	10,00	09/02/2012	22/02/2012
Démolition diverses	10,00	06/07/2011	21/07/2011
Reprise en sous oeuvre des coursives et reprise mur central	40,00	13/07/2011	06/10/2011
Reprise maçonneries diverses	15,00	20/09/2011	10/10/2011
Sablage	7,00	11/10/2011	19/10/2011
Fondations et élévation gaine ascenseur	18,00	06/07/2011	30/08/2011
Enduit isolant au mortier de chanvre	25,00	21/10/2011	29/11/2011
02 - COUVERTURE ZINGUERIE	**47,00**	**7/10/2011**	**5/12/2011**
Dépose , chevreter et chassis de toiture	10,00	07/10/2011	20/10/2011
Équipement des chassis desenfumage	2,00	20/10/2011	21/10/2011
Zinguerie	8,00	26/10/2011	08/11/2011
Plancher techniques combles	7,00	07/12/2011	15/12/2011
03- METALERIE	**67,00**	**1/10/2011**	**9/02/2012**
Ossatures planchers vitrés	10,00	15/11/2011	28/11/2011
Vitres planchers vitrés	3,00	07/02/2012	09/02/2012
Pose portes métalliques	2,00	28/10/2011	02/11/2011
Révision et équipements portes	1,00	08/02/2012	08/02/2012
Verriere	5,00	21/10/2011	27/10/2011
04- MENUISERIES BOIS	**87,00**	**7/10/2011**	**2/03/2012**
Précadre pour menuiseries extérieures	6,00	17/10/2011	24/10/2011
Pose menuiseries exterieures	8,00	19/10/2011	28/10/2011
Révisions menuiseries existantes	4,00	29/11/2011	02/12/2011
Huisseries et chassis intégrés aux cloisons	1,00	02/11/2011	02/11/2011
Ossature bois claustras	12,00	25/10/2011	14/11/2011
Huisseries et chassis	10,00	15/11/2011	28/11/2011
Portes à peindre	2,00	06/12/2011	07/12/2011
Portes stratifiées	5,00	03/02/2012	09/02/2012
Révision et équipements menuiseries exterieures et interieures	4,00	08/02/2012	13/02/2012
Vitrages et miroirs	4,00	25/01/2012	30/01/2012
Plancher bois	4,00	31/01/2012	03/02/2012
Plafond bois	5,00	24/01/2012	30/01/2012
Plinthes , seuils ..etc	9,00	21/02/2012	02/03/2012
Meubles et agencements	2,00	28/02/2012	29/02/2012
Équipement agencement	1,00	01/03/2012	01/03/2012
05-DOUBLAGES CLOISONS PLAFONDS PEINTURE	**89,00**	**7/10/2011**	**6/03/2012**
Cloisons	7,00	27/10/2011	08/11/2011
Plafonds	7,00	09/11/2011	18/11/2011
Isolation combles	5,00	30/11/2011	06/12/2011
Preparations pour peinture	25,00	06/12/2011	23/01/2012
Peinture murs et plafonds	25,00	13/12/2011	30/01/2012
lait de chaux sur plafond	20,00	10/01/2012	06/02/2012
Peinture et vernis boiseries	21,00	13/12/2011	24/01/2012
Vitrification	4,00	06/02/2012	09/02/2012
Retouches et nettoyage	10,00	05/03/2012	16/03/2012
06- CARRELAGE FAIENCES	**30,00**	**1/11/2011**	**3/01/2012**
Ravoirage	3,00	21/11/2011	23/11/2011
Chape liquide	3,00	08/12/2011	12/12/2011
Pose carrelage	3,00	22/12/2011	09/01/2012
Revêtements muraux	4,00	10/01/2012	13/01/2012
07- SOL COULE	**15,00**	**7/02/2012**	**7/02/2012**
Sol décoratif	15,00	07/02/2012	27/02/2012
08- PLOMBERIE	**120,00**	**6/07/2011**	**7/02/2012**
Dépose	2,00	06/07/2011	07/07/2011
Canalisations	8,00	27/10/2011	09/11/2011
Appareils sanitaire	4,00	31/01/2012	03/02/2012
Accessoires	1,00	06/02/2012	06/02/2012
Mise en eau et essais	2,00	06/02/2012	07/02/2012
09- CHAUFFAGE VENTILATION	**124,00**	**6/07/2011**	**3/02/2012**
Depose	2,00	06/07/2011	07/07/2011
Canalisations , cablage regulation et gaines ventilation	15,00	26/10/2011	18/11/2011
Plancher chauffant	10,00	24/11/2011	07/12/2011
Prechauffage plancher chauffant	7,00	10/01/2012	18/01/2012
Chaufferie et locaux techniques	10,00	21/11/2011	02/12/2011
Repose radiateurs	3,00	31/01/2012	02/02/2012
vannes , bouches et équipements	5,00	31/01/2012	06/02/2012
Essais et mise en service	5,00	07/02/2012	13/02/2012
10- ELECTRICITE COURANTS FAIBLES	**151,00**	**6/07/2011**	**1/03/2012**
Dépose et neutralisation	3,00	06/07/2011	08/07/2011
Fourreaux et chemins cables	15,00	09/11/2011	30/11/2011
Cables et fils	15,00	17/11/2011	07/12/2011
Tableaux et armoires	10,00	24/01/2012	06/02/2012
Appareillage , équipements et luminaires	15,00	31/01/2012	20/02/2012
Essais et mise en service	5,00	16/02/2012	22/02/2012
Consuel branchement définitif et mise en service avec EROF	20,00	23/02/2012	21/03/2012
11- ASCENSEUR	**71,00**	**8/10/2011**	**2/02/2012**
Intervention en gaine	15,00	28/10/2011	22/11/2011
Habillage embrasures	1,00	24/01/2012	24/01/2012
Essais et mise en service	5,00	16/02/2012	22/02/2012
Nettoyage et réception	15,00	12/03/2012	30/03/2012
		Nouveau récapitulatif 1	

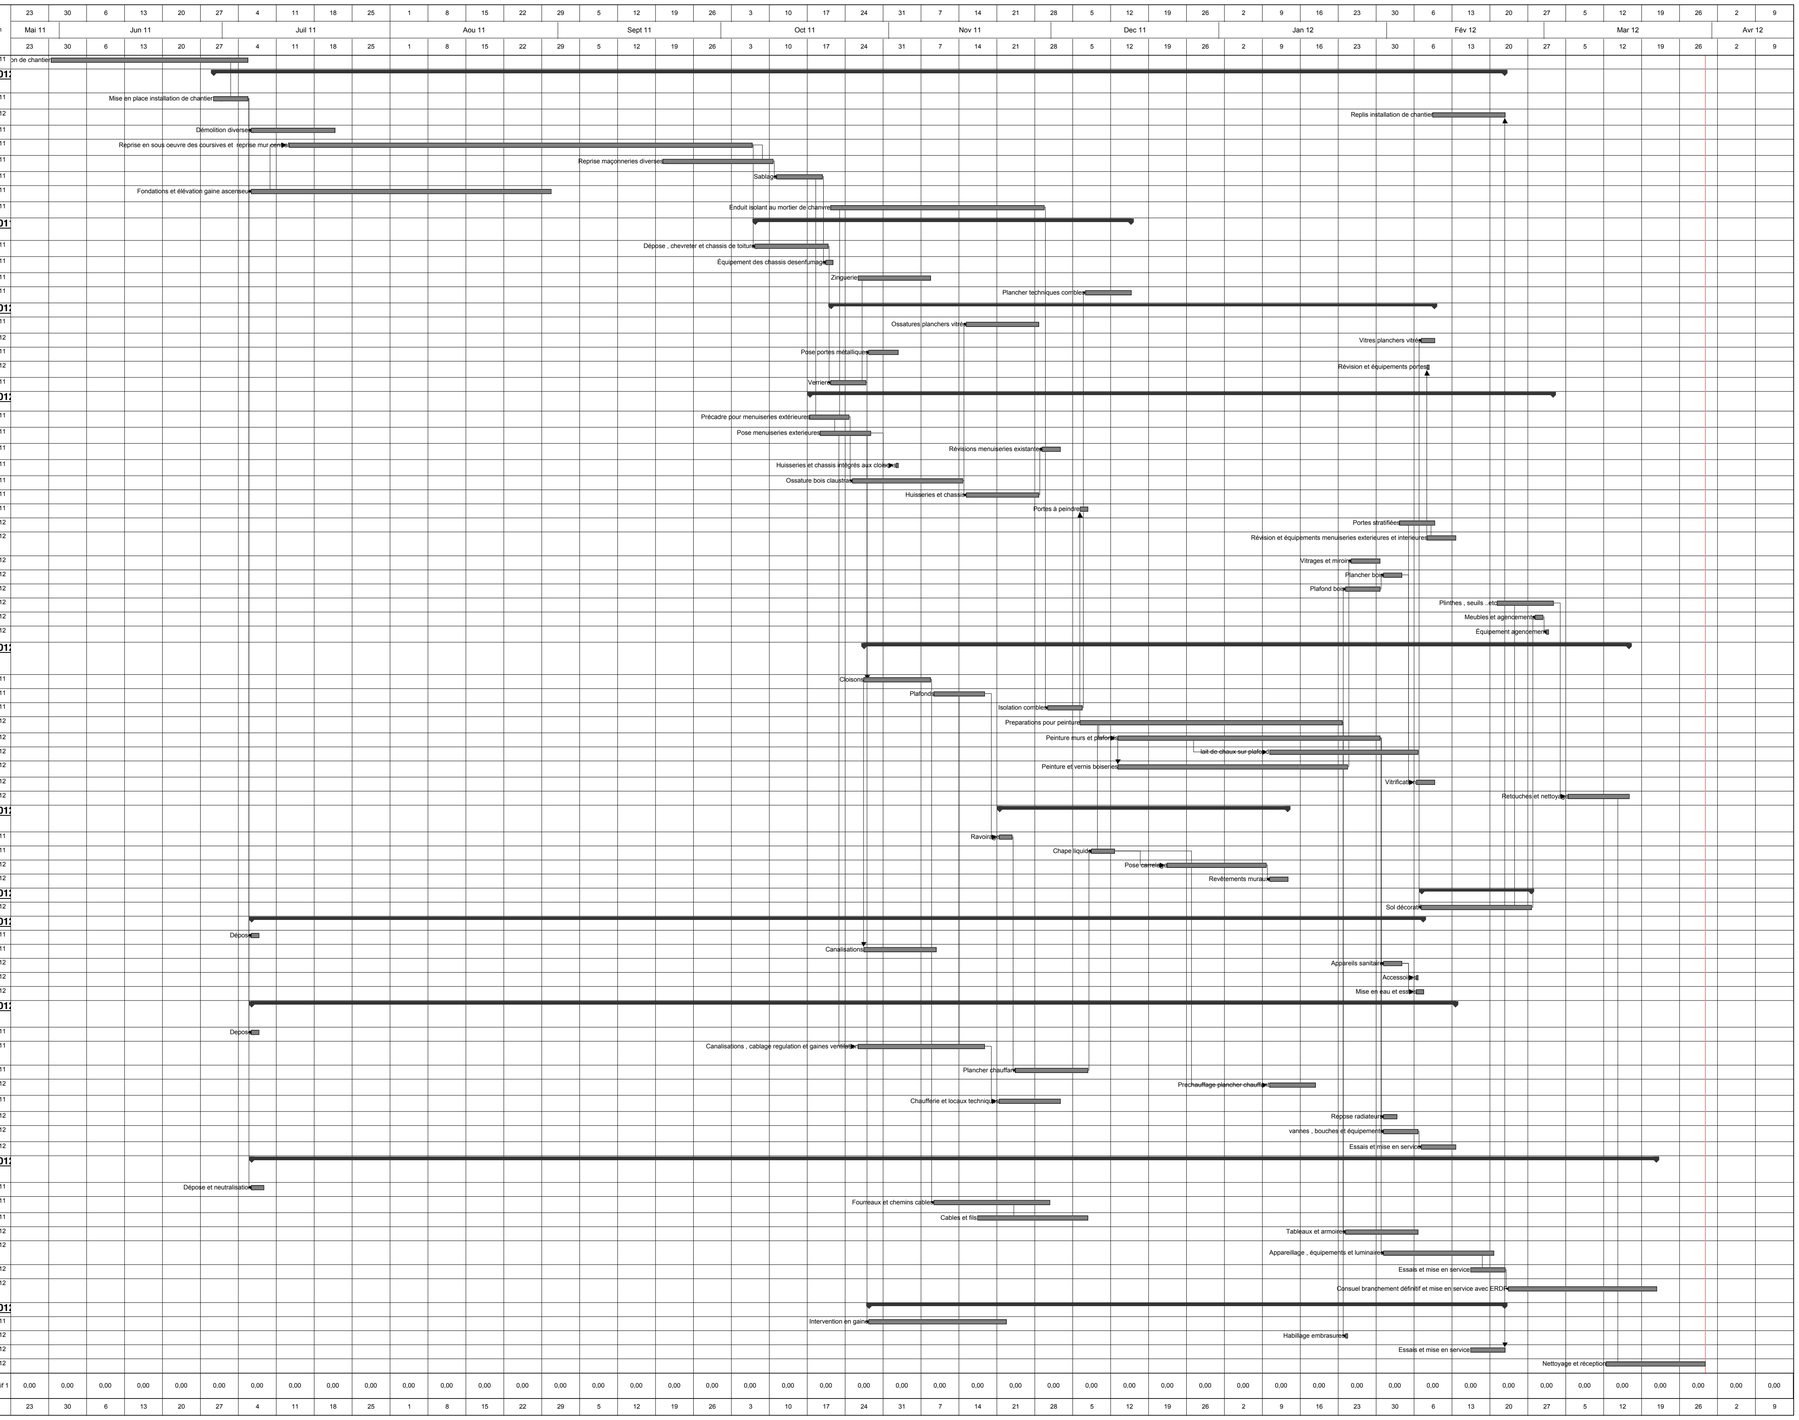

24 Mars 2011

REICHARDT FERREUX ARCHITECTES
